

# Cadre et point d'étape du SCoT

Présentation  
Conseil municipal  
d'Huez

26 janvier 2022





# Ordre du jour



1. Contexte politique
2. Cadre technique
3. Travail réalisé par thématique
4. Planning des études







# 1. Contexte politique



# 1. Contexte politique



**Septembre 2020** : Conscients des difficultés rencontrées précédemment, le nouveau Conseil communautaire a exprimé sa volonté de travailler sur un tout nouveau projet de territoire.

**Novembre 2020** : Un audit complet des 19 communes a été réalisé par le Vice-Président en charge du SCoT et l'AMO Urbanisme pour faire émerger les visions intercommunales et établir un bilan des forces et faiblesses des SCoT précédents. De ces échanges, 3 axes de travail se sont dessinées :

- Axe 1 : Les mobilités au service de la complémentarité du territoire
- Axe 2 : Une vie à l'année s'appuyant sur les atouts du territoire
- Axe 3 : Un cadre environnemental et patrimonial à préserver et à intégrer

## 2011 – 2020 :

- Deux abandons de projet, respectivement en 2017 et 2019.
- Absence d'avancée du dossier courant 2020 du fait de la crise sanitaire
- 2 Commissions SCoT fin 2020 (septembre et novembre)



# 1. Contexte politique



**Début octobre 2021** : Séminaire en groupe de travail SCoT pour réfléchir à des orientations politiques générales.

**Fin octobre 2021** : Amendements des orientations politiques générales proposées par le groupe de travail SCoT.


**Novembre 2021** : Amendements puis délibération du Conseil communautaire approuvant les orientations politiques générales. Celles-ci permettront de guider et d'organiser les phases de travail stratégiques ainsi que les plans d'actions opérationnels.

## **Prochaines échéances 2022 :**

- 1<sup>ère</sup> Commission SCoT – Début février
- 1<sup>er</sup> Bureau communautaire – Fin février
- 1<sup>er</sup> Conseil communautaire – Mars

## **2021 :**

- 3 Commissions SCoT en 2021 (avril, novembre et décembre)





# 1. Contexte politique



## Délibération du Conseil communautaire n°CCO\_2021\_163 en date du 4 novembre 2021 :

« Le **tourisme** devra être durable, en s'appuyant sur les 4 piliers du développement durable, dans toutes ses formes. Ainsi, si le volet environnemental est important, il faudra également s'assurer de la rentabilité des activités économiques, d'un niveau d'accueil professionnel et de qualité ainsi que d'une gouvernance partagée. En effet, ce travail sera collectif. Il rassemblera les diversités d'activités pour permettre une coordination à l'échelle du territoire.

*Forts d'une économie touristique solide, autour du vélo et du ski, d'autres produits seront mis en place au travers de la promotion de l'Oisans.*

*Afin que ces ambitions touristiques ne conduisent pas à une désertion des résidents, elles devront être couplées à une priorisation réglementaire forte des lits chauds et permanents. »*

# 1. Contexte politique



## Délibération du Conseil communautaire n°CCO\_2021\_163 en date du 4 novembre 2021 :

« La **politique mobilité** de l'Oisans doit également être ambitieuse. A l'horizon 2040, la voiture émettrice de gaz à effet de serre devra être remplacée par une colonne vertébrale câblée, par le développement de pôles multimodaux et par des offres zéro émission multi-usages.

*Le maillage territorial entre les communes, est autant prévu entre les communes, en direct, qu'au départ de Bourg d'Oisans. Il inclut donc des ascenseurs valléens et des transports transversaux/horizontaux d'altitude, directement entre les pôles de population ou d'attractivité, au regard des avantages qu'ils apportent.*

*Quant à la desserte des hameaux, elle pourra être compensée par le transport à la demande. Une solution ferroviaire devra elle être étudiée pour l'accessibilité aval du territoire.*

*Ainsi, un maillage global, efficace et transversal devra être construit. Enfin, le numérique facilitera la mise en place de services sans mobilité physique. »*



# 1. Contexte politique



## Délibération du Conseil communautaire n°CCO\_2021\_163 en date du 4 novembre 2021 :

« En **matière d'environnement**, l'Oisans est un territoire historique de préservation de la biodiversité et de la ressource en eau, où les retenues collinaires présentent un intérêt majeur et multiple.

Localement, assurer l'accès et la préservation du Parc national des Ecrins, tout comme des Espaces Naturels Sensibles (ENS), est nécessaire.

Des objectifs forts de développement des énergies renouvelables et de rénovation thermique des bâtiments doivent être engagés, prioritairement par la sphère publique puis, par les privés. Couplé à la volonté de suppression de la voiture émettrice de GES à l'horizon 2040, les effets combinés permettront une amélioration de la qualité de l'air.

Egalement, le meilleur déchet étant celui qu'on ne produit pas, le territoire vise la suppression des emballages, plastique ou carton, à court terme, en s'inscrivant dans les objectifs supra-territoriaux. »



# 1. Contexte politique



## Délibération du Conseil communautaire n°CCO\_2021\_163 en date du 4 novembre 2021 :

« **L'économie** du territoire, composée du **volet agricole** et de la **filière sylvicole** en devenir, doit s'appuyer prioritairement sur le tissu économique local, tout en permettant les installations nouvelles.

A cette fin, la gestion foncière devra être renforcée à travers un partenariat entre la Communauté de communes de l'Oisans et les communes. La proximité, la complémentarité et la diversité seront des principes pour le maintien des activités économiques et des offres de services réparties uniformément sur le territoire.

Egalement, des filières spécifiques à notre territoire de montagne pourront être développées, comme des formations aux « métiers de la montagne », du « fait en Oisans » ou encore du « production bois local ». »



# 1. Contexte politique



## Délibération du Conseil communautaire n°CCO\_2021\_163 en date du 4 novembre 2021 :

*« En **matière d'urbanisme**, le logement fait partie des enjeux du territoire pour attirer des populations permanentes. Il est donc essentiel, aussi bien pour les petites communes que pour les stations.*

*Afin de construire le volet urbanisme du SCoT Oisans 2040, la stratégie est de procéder à une nouvelle analyse des besoins des communes, en purgeant les dossiers aboutis et en affectant les surfaces pour des dossiers « réels », définis dans le projet de territoire, en tenant compte des opportunités dans les enveloppes urbaines, avec le maintien d'une réserve éventuelle à attribuer pour les projets à venir. »*




## 2. Cadre technique





## 2. Cadre technique

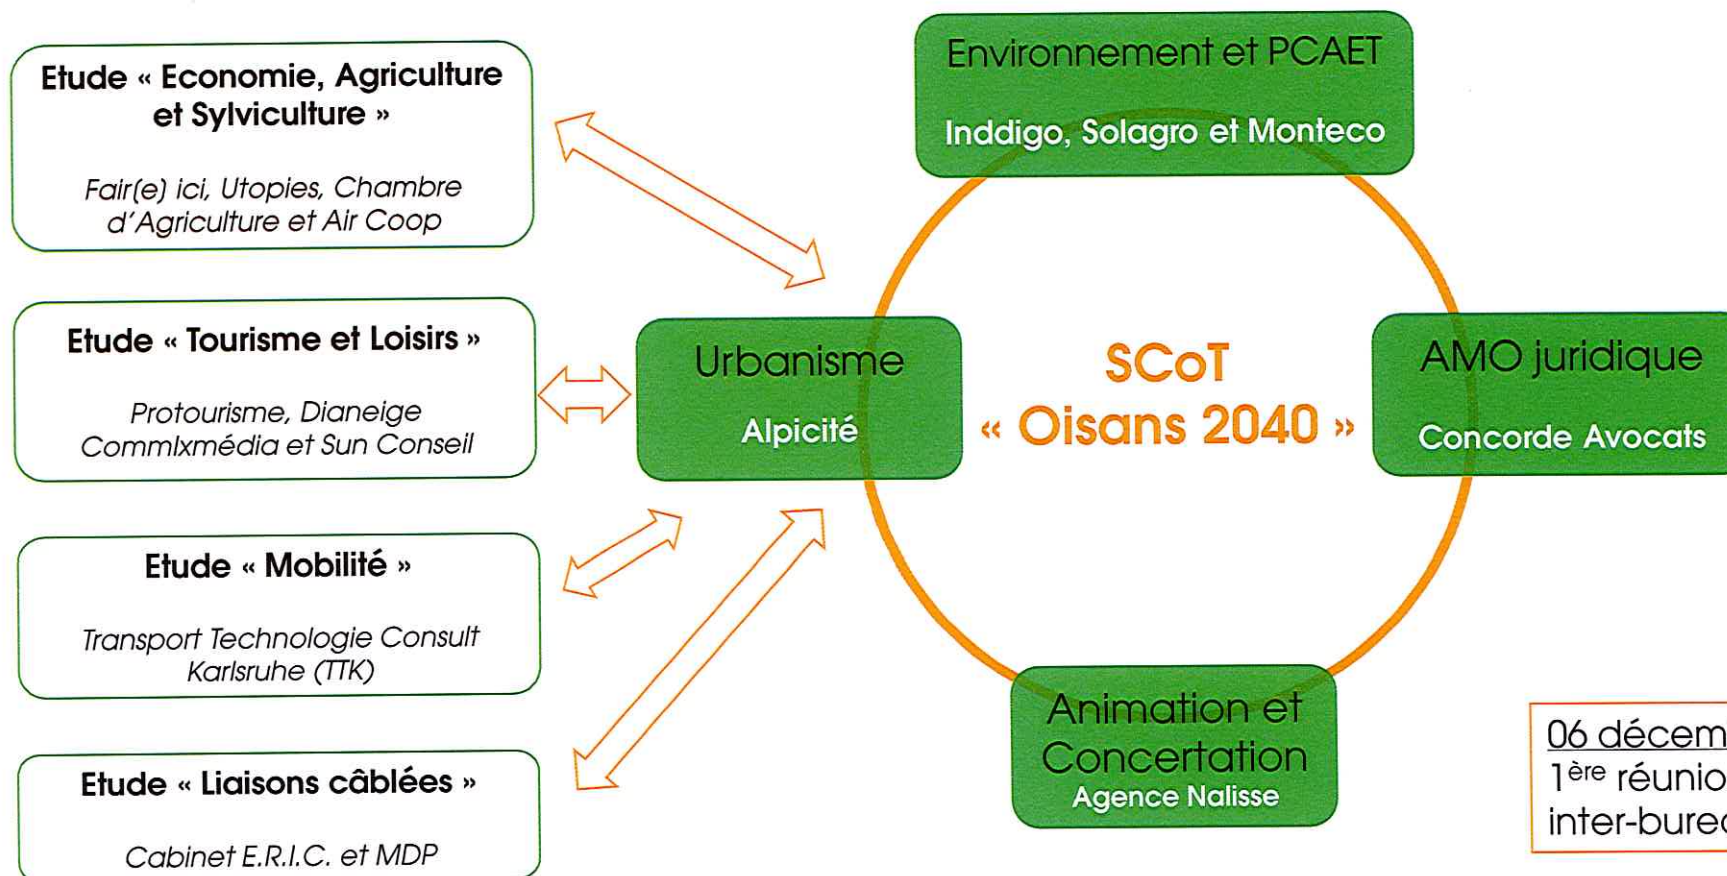

06 décembre 2021 :  
1<sup>ère</sup> réunion de coordination  
inter-bureaux d'études



### 3. Travail réalisé par thématique





### 3. Travail réalisé par thématique



#### Etude « Tourisme et Loisirs »

**Prestataire :** Protourisme, Dianergie, Commlxmédia et Sun Conseil.

#### Travail réalisé :

##### Espace valléen

- Présentation / Amendements du diagnostic pour la candidature « Espace valléen » en Commission SCoT (15 avril 2021)
- Ateliers pour définir les orientations stratégiques (2 journées : 26 au 27 avril 2021)
- Priorisation des orientations stratégiques en Comité de pilotage (11 mai 2021)
- Présentation / Amendements de la candidature Espace valléen en Bureau communautaire (1 juin 2021)
- Délibération sur la candidature Espace valléen en Conseil communautaire (10 juin 2021 car dépôt avant le 15 juin 2021)



### 3. Travail réalisé par thématique



#### Etude « Tourisme et Loisirs »

##### Travail réalisé :

##### Diagnostic

- Présentation du volet immobilier de loisir en groupe de travail SCoT (28 septembre 2021)
- Présentation du volet immobilier de loisir en Commission SCoT (9 novembre 2021)
- Présentation du diagnostic hors volet immobilier de loisir en groupe de travail SCoT (4 janvier 2022)

##### Stratégie

- Présentation de la stratégie avec les directeurs des offices du tourisme (12 octobre 2021)
- Présentation de la stratégie avec les directeurs des offices du tourisme (21 octobre 2021)
- Présentation de la stratégie avec les directeurs des offices du tourisme (2 novembre 2021)
- Présentation de la stratégie avec les directeurs des remontées mécaniques (15 décembre 2021)



### 3. Travail réalisé par thématique



#### **Etude « Economie, Agriculture et Sylviculture »**

**Prestataire :** Fair(e) ici, Utopies, Chambre d'Agriculture et Air Coop.

#### **Travail réalisé :**

##### **Diagnostic**

- Réunion de lancement (*5 mai 2021*)
- Atelier « Perceptions du territoire » (*14 juin 2021*)
- Atelier « Cartographie des ressources et des projets » (*24 juin 2021*)
- Présentation du diagnostic en groupe de travail SCoT (*21 septembre 2021*)
- Présentation du diagnostic en Commission SCoT (*9 novembre*)
- Présentation du diagnostic en Bureau communautaire (*25 novembre*)
- Délibération approuvant le diagnostic en Conseil communautaire (*9 décembre*)

##### **Stratégie**

- Atelier « Enjeux du territoire » (*28 septembre 2021*)
- Présentation de la stratégie en groupe de travail SCoT (*18 janvier 2021*)



### 3. Travail réalisé par thématique



#### Etude « Mobilité »

**Prestataire :** Transport Technologie Consult Karlsruhe (TTK).

**Travail réalisé :**

- Jury de sélection (*21 septembre 2021*)
- Réunion de lancement en Commission Mobilité (*14 décembre 2021*)

#### Etude « Liaisons câblées »

**Prestataire :** Cabinet E.R.I.C. et MDP.

**Travail réalisé :**

- Jury de sélection (*21 septembre 2021*)
- Réunion de lancement en Commission Mobilité (*14 décembre 2021*)



### 3. Travail réalisé par thématique



#### AMO Environnement

**Prestataire :** Solagro, Monteco et Inddigo.

**Travail réalisé :**

- Réunion de lancement (29 juin 2021)
- Présentation du diagnostic en groupe de travail SCoT (16 décembre)

#### AMO Urbanisme

**Prestataire :** Cabinet Alpicité

**Travail réalisé :**

- Présentation des tendances démographiques, des volumes logements et des chiffres de l'emploi, ainsi que des conséquences de la loi dite « Climat et Résilience » en Commission SCoT (29 avril 2021).

### 3. Travail réalisé par thématique



#### AMO Animation et Concertation

**Prestataire :** Agence Nalisse.

**Travail réalisé :**

- Jury de sélection (*16 septembre 2021*)
- Réunion de lancement (*3 décembre 2021*)
- Partage des éléments généraux sur le cadre de la participation en Commission SCoT (*7 décembre 2021*)
- Travail sur les engagements des élus et premières réflexions sur le cadre et le planning de la participation en groupe de travail SCoT (*11 janvier 2022*)



### 3. Travail réalisé par thématique



#### Communication

**Prestataire :** Géré en interne par la Communauté de communes de l'Oisans.

#### Travail réalisé :

- Validation du plan d'action 2021 en Commission SCoT (13 avril 2021)
- Validation de la charte graphique en Bureau communautaire (6 mai 2021)
- Publication des planches de la BD « Oisans 2040 » régulièrement tout au long de l'été. Ce contenu pédagogique a été réalisé par Cled'12 à partir de la BD du SCoT des Rives-du-Rhône (été 2021)

#### Travail en cours / à venir :

- Lancement d'un site web « Oisans 2040 »
- Publication d'une cartographie ludique et pédagogique du territoire dans le prochain numéro du Courrier de l'Oisans et qui figurera, notamment, sur le site interne
- Préparation de deux vidéos en motion design
- Préparation d'une newsletter



## 4. Planning des études





## 4. Planning des études

### Etude « Tourisme et Loisirs »

|                                                                                                                           | 2021 |     | 2022 |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-----|------|-------|-----|------|---------|------|------|-----|-----|-----|
|                                                                                                                           | NOV  | DEC | JANV | FEV | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DEC |
| <b>TOURISME ET LOISIRS</b>                                                                                                |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| <b>Diagnostic</b>                                                                                                         |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Groupe de travail SCoT de validation                                                                                      |      |     | 4    |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Commission de validation                                                                                                  |      |     |      | 3   |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Bureau de validation                                                                                                      |      |     |      | 10  |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Conseil de validation                                                                                                     |      |     |      |     | 3    |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| <b>Stratégie + Définition noms FA</b>                                                                                     |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| 3ème visio avec les OT sur le mapping                                                                                     | 2    |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Visio avec les RM sur le mapping                                                                                          |      | 15  |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Groupe de travail SCoT de validation                                                                                      |      |     |      | 1   |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Groupe de travail SCoT pour un croisement des stratégies "Tourisme et Loisirs" et "Economie, Agriculture et Sylviculture" |      |     |      |     | 8    |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Commission de validation                                                                                                  |      |     |      |     | 17   |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Bureau de validation                                                                                                      |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Conseil de validation                                                                                                     |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| <b>Rédaction des fiches actions</b>                                                                                       |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Atelier participatif pour choisir les fiches actions                                                                      |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Groupe de travail SCoT de validation                                                                                      |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Commission de validation                                                                                                  |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Bureau de validation                                                                                                      |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Conseil de validation                                                                                                     |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |

⚠ Les dates surlignées en rouge sont des propositions. Elles sont susceptibles de modifications selon les contraintes d'agenda et l'avancée de l'étude.

⚠ Les cases en rouge sont des périodes pré-ciblées. Elles sont également susceptibles de modifications pour les mêmes raisons que citées précédemment.

## 4. Planning des études

### Etude « Economie, Agriculture et Sylviculture »

|                                                                                                                           | 2021 |     | 2022 |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-----|------|-------|-----|------|---------|------|------|-----|-----|-----|
|                                                                                                                           | NOV  | DEC | JANV | FEV | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DEC |
| <b>ECONOMIE, AGRICULTURE ET SYLVICULTURE</b>                                                                              |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| <b>Diagnostic</b>                                                                                                         |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Commission de validation                                                                                                  | 9    |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Bureau de validation                                                                                                      |      | 25  |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Conseil de validation                                                                                                     |      |     | 9    |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| <b>Stratégie + Définition des noms des FA</b>                                                                             |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Groupe de travail SCoT de validation                                                                                      |      |     |      | 18  |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Groupe de travail SCoT pour un croisement des stratégies "Tourisme et Loisirs" et "Economie, Agriculture et Sylviculture" |      |     |      |     | 8    |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Commission de validation                                                                                                  |      |     |      |     |      | 17    |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Bureau de validation                                                                                                      |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Conseil de validation                                                                                                     |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| <b>Rédaction des fiches actions</b>                                                                                       |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Groupe de travail SCoT de validation                                                                                      |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Commission de validation                                                                                                  |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Bureau de validation                                                                                                      |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Conseil de validation                                                                                                     |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |

△ Les dates surlignées en rouge sont des propositions. Elles sont susceptibles de modifications selon les contraintes d'agenda et l'avancée de l'étude.

△ Les cases en rouge sont des périodes pré-ciblées. Elles sont également susceptibles de modifications pour les mêmes raisons que citées précédemment.



## 4. Planning des études

### Etude « Environnement »

|                                                   | 2021 |     | 2022 |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
|---------------------------------------------------|------|-----|------|-----|------|-------|-----|------|---------|------|------|-----|-----|-----|
|                                                   | NOV  | DEC | JANV | FEV | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DEC |
| <b>ENVIRONNEMENT</b>                              |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| <b>Diagnostic</b>                                 |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Groupe de travail SCoT de présentation            |      | 16  |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Commission de présentation du diagnostic          |      |     |      | 3   |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Bureau de présentation du diagnostic              |      |     |      | 10  |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Conseil de validation du diagnostic               |      |     |      |     | 3    |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| <b>Enjeux</b>                                     |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Groupe de travail SCoT de présentation des enjeux |      |     |      | 25  |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Atelier participatif                              |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Groupe de travail SCoT de validation              |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Bureau de validation                              |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Conseil de validation                             |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |

⚠ Les dates surlignées en rouge sont des propositions. Elles sont susceptibles de modifications selon les contraintes d'agenda et l'avancée de l'étude.

⚠ Les cases en rouge sont des périodes pré-ciblées. Elles sont également susceptibles de modifications pour les mêmes raisons que citées précédemment.

## 4. Planning des études

### Etude « Mobilité »

|                                      | 2021 |     | 2022 |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
|--------------------------------------|------|-----|------|-----|------|-------|-----|------|---------|------|------|-----|-----|-----|
|                                      | NOV  | DEC | JANV | FEV | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DEC |
| <b>MOBILITE</b>                      |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| <b>Diagnostic</b>                    |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Groupe de travail SCoT de validation |      |     |      | 15  |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Commission de validation             |      |     |      | 24  |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Bureau de validation                 |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Conseil de validation                |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| <b>Stratégie</b>                     |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Groupe de travail SCoT de validation |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Commission de validation             |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Bureau de validation                 |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Conseil de validation                |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| <b>Rédaction du scénario</b>         |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Groupe de travail SCoT de validation |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Commission de validation             |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Bureau de validation                 |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Conseil de validation                |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |

△ Les dates surlignées en rouge sont des propositions. Elles sont susceptibles de modifications selon les contraintes d'agenda et l'avancée de l'étude.

△ Les cases en rouge sont des périodes pré-ciblées. Elles sont également susceptibles de modifications pour les mêmes raisons que citées précédemment.



## 4. Planning des études

### Etude « Liaisons câblées »

|                                                                 | 2021 |     | 2022 |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----|------|-----|------|-------|-----|------|---------|------|------|-----|-----|-----|
|                                                                 | NOV  | DEC | JANV | FEV | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DEC |
| <b>LAISONS CABLEES</b>                                          |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| <b>Tranche ferme</b>                                            |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Groupe de travail SCoT d'échanges autour des potentiels fuseaux |      |     |      | 8   |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Commission de validation des fuseaux et des critères            |      |     |      | 24  |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Bureau de validation                                            |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Conseil de validation                                           |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Groupe de travail SCoT de validation des fiches actions         |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Commission de validation des fiches actions                     |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Bureau de validation des fiches actions                         |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| Conseil de validation                                           |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| <b>Tranche optionnelle 1</b>                                    |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| A définir                                                       |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| <b>Tranche optionnelle 2</b>                                    |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |
| A définir                                                       |      |     |      |     |      |       |     |      |         |      |      |     |     |     |

⚠ Les dates surlignées en rouge sont des propositions. Elles sont susceptibles de modifications selon les contraintes d'agenda et l'avancée de l'étude.

⚠ Les cases en rouge sont des périodes pré-ciblées. Elles sont également susceptibles de modifications pour les mêmes raisons que citées précédemment.

## 4. Planning des études

### Etude « Urbanisme »

|                      | 2021         |  |  |  | 2022         |  |              |  | 2023         |  |              |  |
|----------------------|--------------|--|--|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|
|                      | 2ec semestre |  |  |  | 1er semestre |  | 2ec semestre |  | 1er semestre |  | 2ec semestre |  |
| <b>URBANISME</b>     |              |  |  |  |              |  |              |  |              |  |              |  |
| Elaboration du PAS   |              |  |  |  |              |  |              |  |              |  |              |  |
| Elaboration du DOO   |              |  |  |  |              |  |              |  |              |  |              |  |
| Avis des PPA         |              |  |  |  |              |  |              |  |              |  |              |  |
| Enquête publique     |              |  |  |  |              |  |              |  |              |  |              |  |
| Finalisation du SCoT |              |  |  |  |              |  |              |  |              |  |              |  |
| Contrôle de légalité |              |  |  |  |              |  |              |  |              |  |              |  |

△ Les périodes sont données à titre indicatif.





Nous restons à votre  
disposition pour toutes  
informations  
supplémentaires !

Contact :

Lorène Soyer, Chargée de  
mission SCoT et Mobilité

[l.soyer@ccoisans.fr](mailto:l.soyer@ccoisans.fr)

07 57 00 08 23

